

Référence

Nouvelle construction de la filiale Müller

Lieu

Winzauerstrasse 97
4632 Trimbach

Maître d'ouvrage

Müller Handels AG
Industriestrasse 50
5036 Oberentfelden

Temps de réalisation


12.07.2023 –
19.10.2023

Volume de construction (MCHF)

Total: 0.24
Participation ETAVIS: 0.24



Extérieur

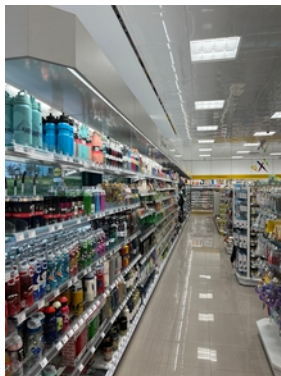

Intérieur

Type d'objet immobilier

Nouvelle construction

Type de construction

Magasin

Contenu de la livraison

Eclairage


Installations électriques

Mise en service

Installation de dispositifs d'évacuation et de sonorisation



Intérieur

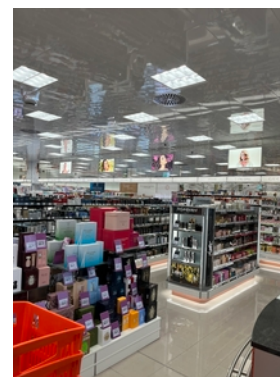

Intérieur

Le département Aménagement de magasins de la BU23 a été chargé de réaliser la filiale de Müller Handels AG à la Winznauerstrasse 97 à Trimbach. Avec une surface de vente d'environ 1300 m², il s'agit d'une succursale de taille moyenne dans un

Mise en place des installations de sécurité

Installations de câbles de télécommunication

Eclairage de secours

Planification électrique

Combinaisons d'appareils de commutation

Sécurité

Courant fort/faible

Installation de stores

UKV

Contrôles indépendants par les services ETAVIS

Tableau Répartitions (HV/UV)

Installation de dispositifs de vidéoconférence

Surveillance vidéo

Systèmes de contrôle d'accès

nouveau bâtiment indépendant.

La plupart des installations ont dû être mises en place à l'aide d'une plateforme élévatrice à une hauteur d'environ 5m. Le calendrier sportif s'est avéré être un défi particulier, en particulier pour les installations HVAC. Finalement, grâce à l'engagement exceptionnel de notre personnel de montage, les délais ont pu être respectés.

Les travaux suivants ont été réalisés pendant la période de construction de juillet à octobre 2023 :

Montage de distributions livrées par le client.

Installations complètes d'éclairage, livraison par le maître d'ouvrage

CVCS

MSR

Raccordement et montage des éclairages de rayonnages et de gondoles

Système de pointage et de contrôle d'accès

Installation de sonorisation (installation EVAK)

Installation de sécurité

Sécurisation des marchandises

Installations CUC

Câblage d'alarme et de surveillance vidéo

Câblage MCRG

L'installation complète a pu être remise au maître d'ouvrage dans les délais et dans les règles de l'art. Le volume de la commande s'est élevé à 0,24 million de francs.
